



HAZENWEGEL 2

9860 OOSTERZELE

Tel. 09/362.48.64


devos1965@telenet.be

H.R. Gent 184.957

B.T.W. BE 0738.297.880

REG. 06/26/00

VDK 890-5440293-79



ELEKTRISCHE HUISINSTALLATIE

Vanderper Elke

Dorpslaan 30

9070 Heusden


Verklaring zekeringen

A	16A	Verlichting Zithoek, eethoek, hal, kelder, sas, slaapkamer 1 en 2
B	16A	Verlichting Keuken, berging en buiten in tuin
C	20A	Stopcontacten Zithoek en eethoek
D	20A	Stopcontacten Keuken
E	20A	Stopcontacten Oven en microgolf
F	20A	Stopcontacten slaapkamer 2 en telenet
G	10A	Bel
H	16A	Res
I	16A	Stopcontacten slaapkamer 1 & stopcontact en verlichting badkamer
J	20A	Stopcontact vaatwas
K	20A	Stopcontact wasmachine
L	20A	Stopcontact droogkast
M	20A	Centrale verwarming
S1		STROOMVERLIESSCHAKELAAR 300mA (KRING A TOT M)
S2		STROOMVERLIESSCHAKELAAR 30mA (KRING H TOT M)
TR		Beltransfo

23.12.2015

David FRANCO
Inspecteur Electriciteit
4273



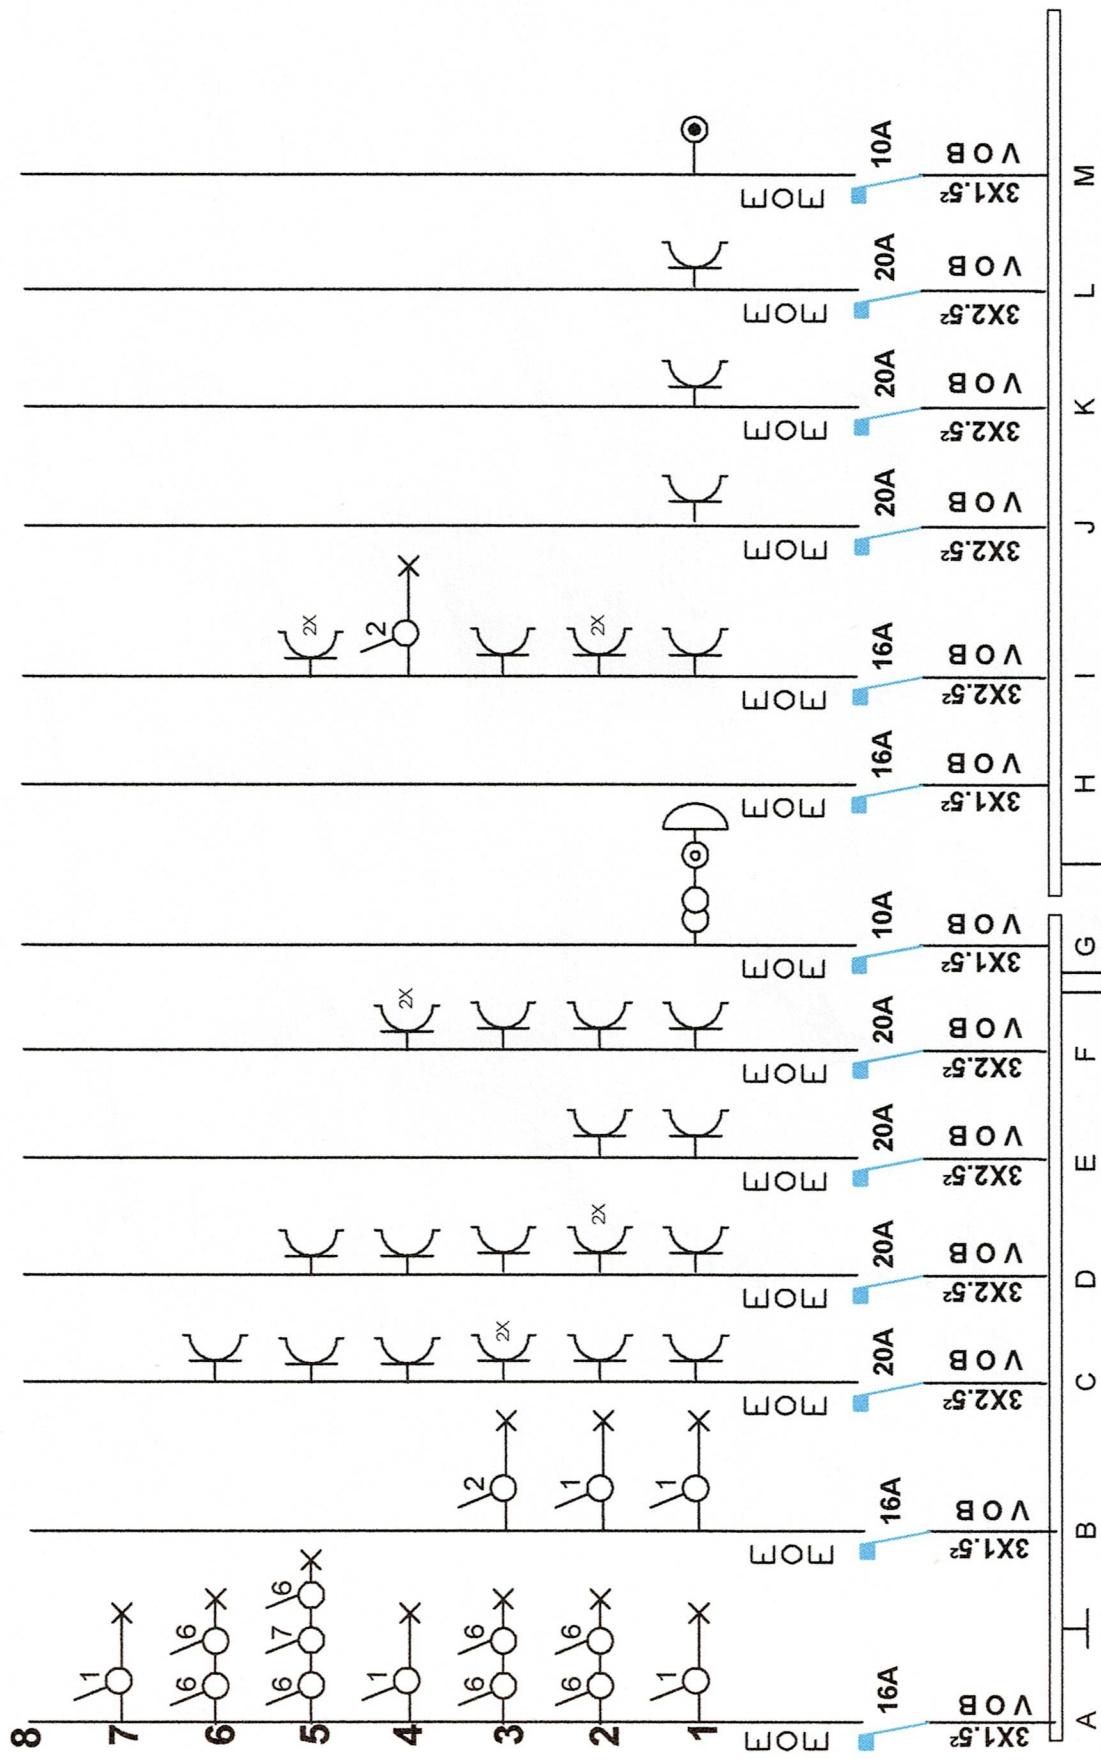


Eigenaar woning
 Vanderper Elke
 Dorpslaan 30
 9070 Heusen


De afgevaardigde van
 het erkend organisme

23.12.2015
 David FRANCO
 Inspecteur Electriciteit
 4273



De verantwoordelijke voor
 de uitvoering van het werk
 De Vos Danny
 Hazenwegel 2
 9860 Oosterzele





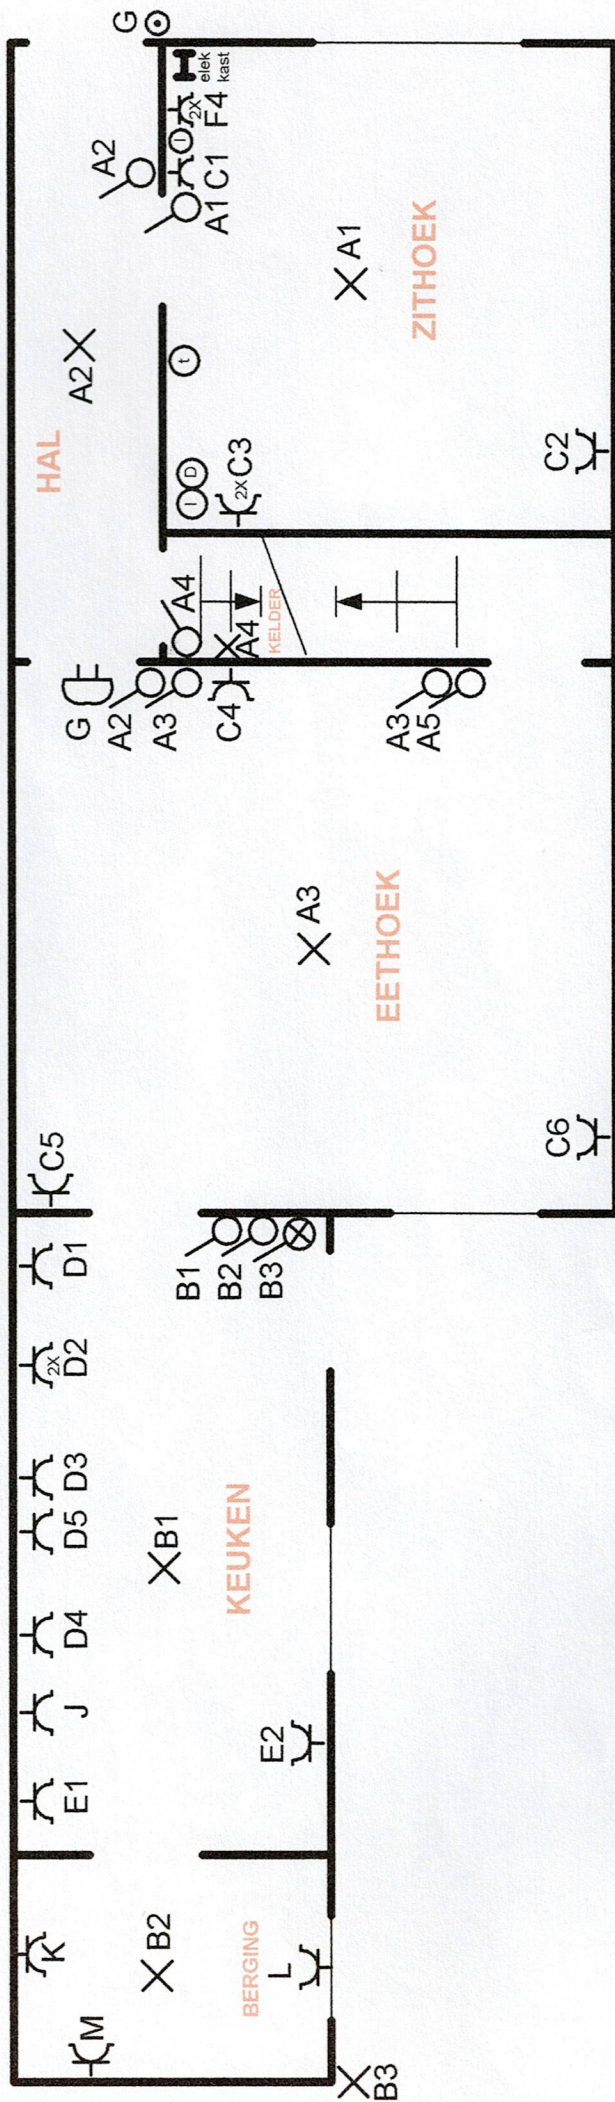

23.12.2015
 David FRANCO
 Inspecteur Electriciteit
 4273



(Handwritten signature)

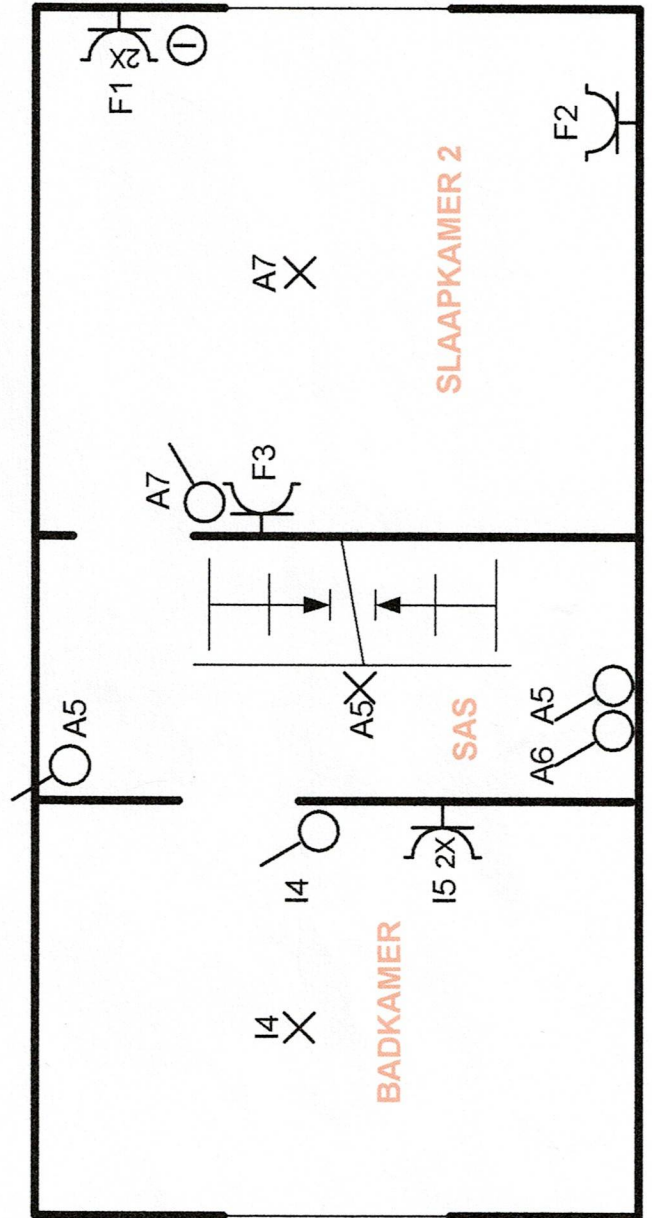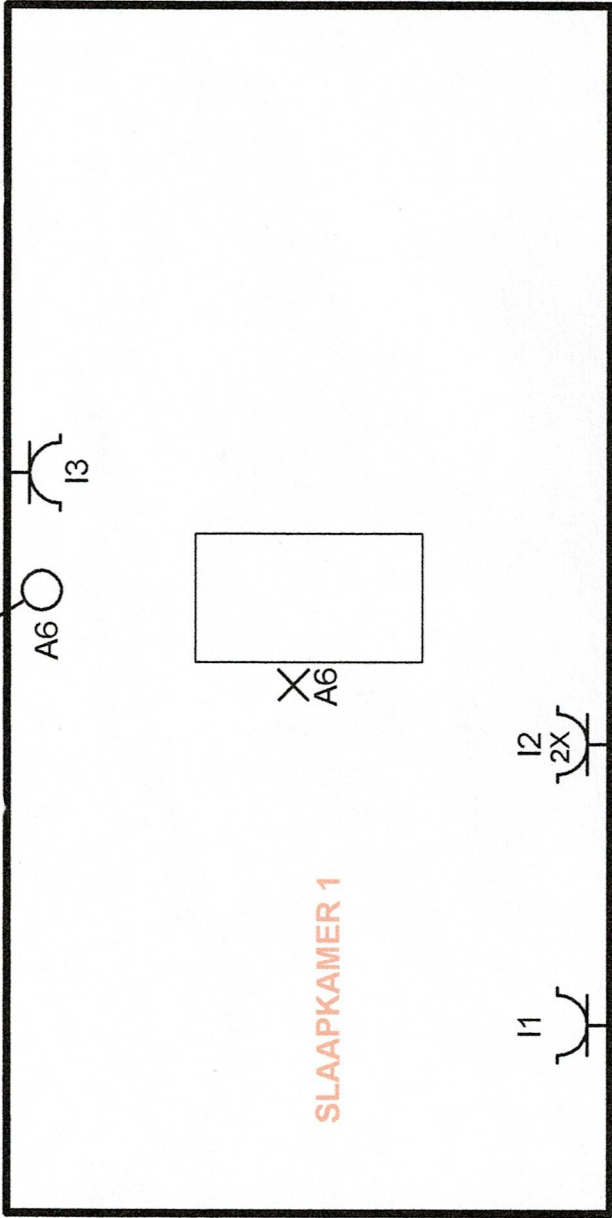

23.12.2015
 David FRANCO
 Inspecteur Electriciteit
 4273





VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. GEN/19/70076675



CN 029177

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: De Vries Sammy
Naam, voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
Tel.:
BTW nr.: BE 0738297820

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270: ingebruikname, wijziging, uitbreiding
Art 271: periodiek, controle
Art 276: verzwaring, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 86, 87, 88, 271 bis, 278
Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr. 35741601, meterstand dag 59195, nacht
Bescherminng aansluiting (A): 020, 025, 032, 040, 050, 063, 080, 100, 112
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230 V, 3x230 V, 3N400 V
Maximale nominale stroom (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 10 mm² - Type: VOB
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 4.0 A / 300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 13
zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 11.5 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 2.1 M Ohm
Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: geen vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie: geen vastgesteld
Opmerkingen: Er werd gewol gegeven aan verslag GEN/19/70076675 van 30/01/2015
Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 23/12/2015 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:
Naam: Franck... Agent nr.: 4213 Datum: 23/12/2015
Bijlage(n): Situatieschema(s): 2, Eëndraadsschema(s): 1
Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15.025.19.02.01



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. GREN/19/1007.6675



CN **022950**

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- Brabant tel.: 02 674 57 11
- Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 14

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
.....	Adres :
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad :
BTW nr.: BE	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Woonenheid
<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk			<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input checked="" type="radio"/> controle	<u>2 Verkoop</u>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input checked="" type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>38741601</u>	meterstand dag : <u>58594</u>	nacht :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input checked="" type="radio"/> 130A	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :	
	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>WAB</u>	<input type="radio"/>	
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen :
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	<u>schemas ter plaatse gelaten</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>50</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>11</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	/
<input type="radio"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<u>1203</u> , <u>1405</u> <u>(diff. 30mA)</u>
<input type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen	/
<input type="radio"/> Nihil	
	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

<input type="radio"/> De nieuwe installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.
<input checked="" type="radio"/> De bestaande installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 30/04/2016 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Logie Anthony Agent nr. : 4034 Datum : 30/04/2015 Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 2 Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
